


計画数量および実施数量表

作業項目	計画数量	実施数量
作業計画	40. 2km	40. 2km
現場下見調査	40. 2km	40. 2km
監視型調査機器【選別】設置	200基	201基
監視型調査機器測定	200基	201基
監視型調査機器【選別】撤去	200基	201基
パソコン解析	200基	201基
路面音聴調査	20km	20km
漏水確認調査	12km	12km
報告書作成	40. 2km	40. 2km

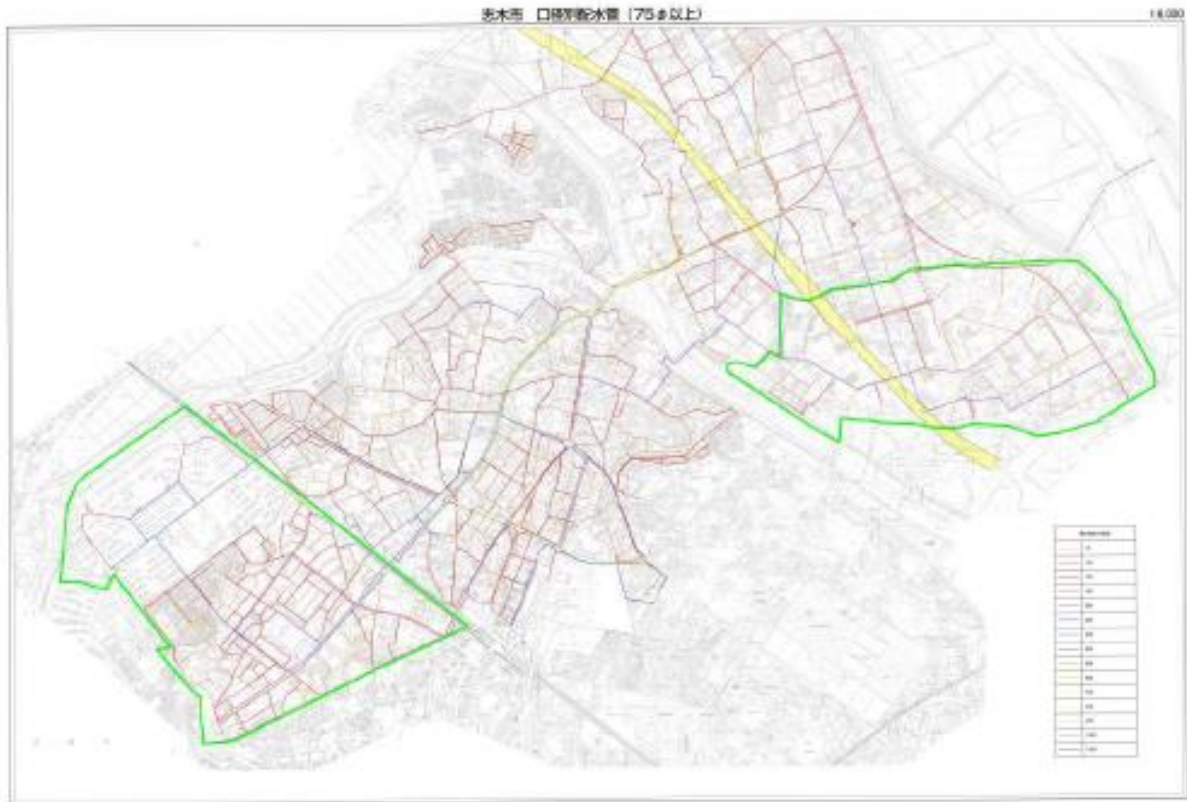

平成 30 年から 5 年の漏水修繕工事实績

年度	配水管						給水管			
	管	継手	仕切弁	空気弁	消火栓	計	管	継手	計量器・分水栓・止水栓	計
H30	5件	1件	3件	0件	2件	11件	11件	14件	136件	161件
R1	5件	3件	1件	0件	0件	9件	6件	26件	122件	154件
R2	0件	1件	4件	0件	1件	6件	5件	10件	91件	106件
R3	1件	0件	0件	0件	0件	1件	12件	25件	71件	108件
R4	0件	1件	2件	0件	0件	3件	9件	14件	86件	111件

実績比較表

調査年度	調査地区		調査仕様		調査延長	推定漏水量(m³/h)	漏水発見件数		監視型調査での 発見割合
R1	志木地区	本町1丁目～6丁目	監視型	185基	46.4km	2.86m³/h	志木地区	11件	31%
	宗岡地区	上宗岡1丁目～4丁目	路面音聴 (PVC管路)	22km			宗岡地区	2件	
R2	志木地区	柏町全域	監視型	185基	46.4km	3.43m³/h	志木地区	6件	41%
	宗岡地区	中宗岡全域	路面音聴 (PVC管路)	22km			宗岡地区	6件	
R3	志木地区	幸町・館全域	監視型	185基	40.2km	1.70m³/h	志木地区	7件	22%
	宗岡地区	下宗岡全域	路面音聴 (PVC管路)	22km			宗岡地区	2件	
R4	志木地区	本町1丁目～6丁目	監視型	193基	47.0km	1.80m³/h	志木地区	4件	20%
	宗岡地区	上宗岡1丁目～4丁目	路面音聴 (PVC管路)	24km			宗岡地区	1件	
R5	志木地区	柏町全域	監視型	200基	47.0km	1.11m³/h	志木地区	3件	20%
	宗岡地区	中宗岡全域	路面音聴 (PVC管路)	24km			宗岡地区	7件	
R6	志木地区	幸町・館全域	監視型	200基	40.2km	1.08m³/h	志木地区	2件	20%
	宗岡地区	下宗岡全域	路面音聴 (PVC管路)	22km			宗岡地区	3件	

漏水発見件数比較表

年度	志木地区			宗岡地区		
	本町	柏町	幸町・館	上宗岡	中宗岡	下宗岡
R1	11件			2件		
R2		6件			6件	
R3			6件			3件
R4	4件			1件		
R5		3件			7件	
R6			2件			3件
合計	15件	9件	8件	3件	13件	6件
