

## 道路排水施設新設・改修状況

### ■道路排水施設（横断側溝・集水柵等）の増設・蓋改修

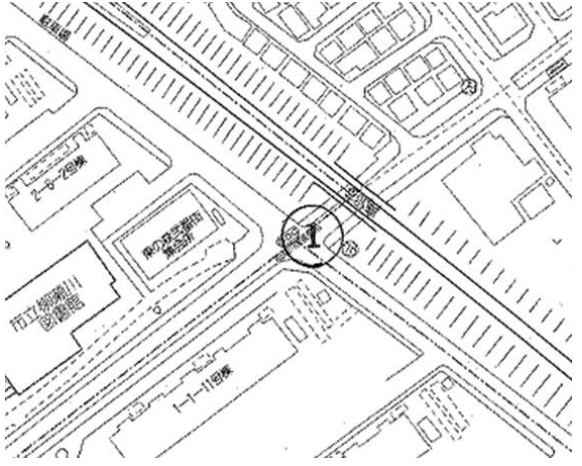

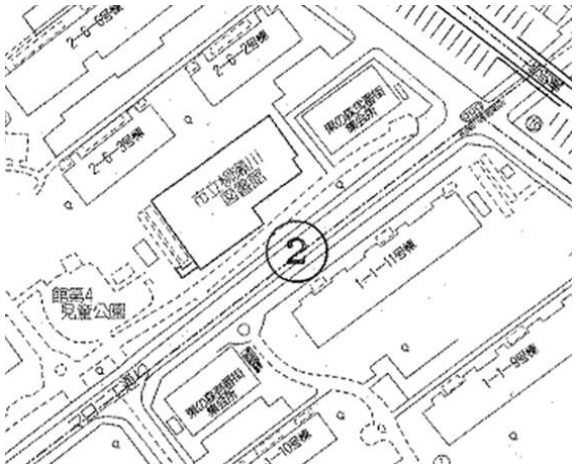

#### 1 工事概要

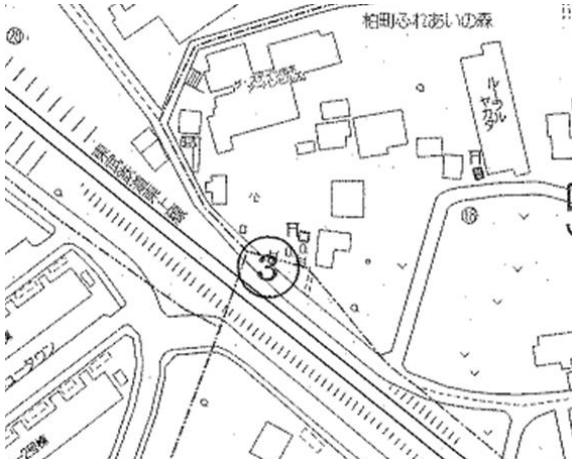





低地部における浸水被害の軽減に向けて、高台地域に道路横断側溝の整備や斜路部の集水柵等の蓋交換を実施する工事であります。

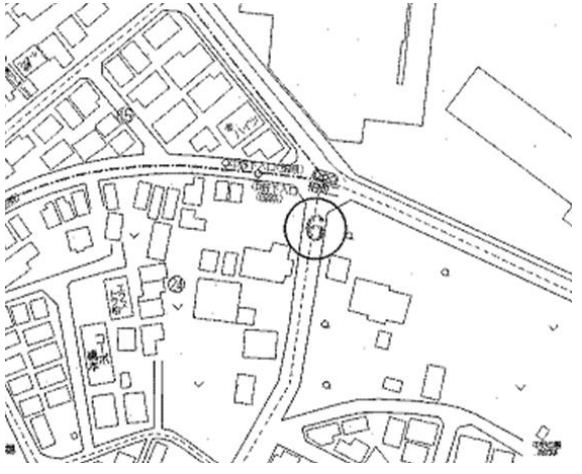

#### 2 平成28年度実施状況

次のとおり、工事を実施しました。

- (1) 横断側溝新設 2箇所（越流防止グレーチング蓋）
- (2) 集水柵新設 3箇所（越流防止グレーチング蓋）
- (3) 蓋改修
  - ①横断側溝 2箇所（越流防止グレーチング蓋）
  - ②集水柵 10箇所（越流防止グレーチング蓋）
  - 12箇所（落葉対策蓋）

位置図	設置状況
	
①柏町6丁目地内（柳瀬川図書館前交差点東）	新設／横断側溝，集水柵（越流防止蓋）
	
②館1，2丁目入会地内（柳瀬川図書館前）	蓋改修／集水柵（越流防止蓋，落葉対応蓋）

位置図	設置状況
	
③ 柏町 5 丁目地内 (神明神社前)	新設／横断側溝，集水枳 (越流防止蓋)
	
④ 柏町 5 丁目地内 (神明神社下)	蓋改修／横断側溝，集水枳 (越流防止式蓋)
	
⑤ 柏町 3, 5 丁目入会地内 (坂下橋交差点上)	蓋改修／横断側溝，集水枳 (越流防止式蓋)

位置図	設置状況
	
<p>⑥ 柏町1丁目地内（柏町2丁目交差点上）</p>	<p>蓋交換／集水樹（越流防止蓋）</p>

### 3 平成29年度実施予定

次のとおり、工事を予定しています。

(1) 場 所／志木市柏町1丁目（宝幢寺北付近）

柏町5丁目（シムラス柏町SS付近）

幸町2丁目（西原／幸町第7市民農園付近）

幸町3丁目（福住児童公園上流付近）

本町2丁目（富士前東児童遊園地北付近）

本町3丁目（富士前西児童遊園地北付近）

本町4丁目（ごんべー山龍雲堂医院付近）

(2) 時 期／平成29年5月～8月

## ■ 柏町6丁目調整池の改修

### 1 工事概要

低地部における浸水被害の軽減に向けて、可搬式排水ポンプによる排水機能の向上を図るため、館第二排水ポンプ場脇調整池の改修を行うものであります。

### 2 平成29年度実施予定

次のとおり、工事を予定しています。

(1) 場 所／志木市柏町6丁目地内

(2) 工事内容／①調整池の掘り下げ

②流入口（導水管）の増設

③法面、底盤部のコンクリート処理

(3) 発注状況／①平成29年5月17日 入札／受注業者決定

②平成29年5月22日 工事請負契約書の締結

工期：契約締結日（平成29年5月22日）～平成29年7月15日

